

Modelo Financiero del Backend

Cuánto cuesta construir y operar la infraestructura diseñada en el Documento 1 — **derivado de ese diseño, no estimado a ojo**. Costo de nube componente por componente, costo real del motor de IA, inversiones únicas, flujo de caja, punto de equilibrio y retorno a cinco años.

Cómo se costeó, y qué NO se hizo

Toda cifra de este documento se puede rastrear hasta una decisión técnica del Documento 1 o hasta una tarifa pública verificable. El método de cada partida se declara junto a ella.

FUENTE 01

Tarifas públicas de nube

Cada componente del diagrama de infraestructura se dimensionó (vCPU, memoria, GB) y se valoró a la tarifa por hora publicada de la región. La tabla muestra la línea completa, no un total redondeado.

FUENTE 02

Tarifas oficiales por millón de tokens

El costo de IA se calculó con las tarifas vigentes por millón de tokens de entrada y de salida de cada modelo, no con una suscripción supuesta. El método de estimación de volumen se detalla en su lámina.

FUENTE 03

Cotizaciones de mercado local

Prueba de intrusión, asesoría jurídica y capacitación se costearon a valores de mercado colombiano, con una contingencia explícita del 15 %.

Alcance del modelo

- **No incluye una valoración de mercado del desarrollo.** El alcance es el costo directo verificable: infraestructura, IA e inversiones únicas.
- **El esfuerzo humano se expresa en horas.** Su valoración económica se define en la asignación presupuestal del proyecto, fuera de este documento.
- **El ahorro se calcula neto** de los costos nuevos que la infraestructura propia incorpora (seguridad, legal, IA).

Supuestos declarados

Tasa de cambio	4.050 COP/USD
Línea base 99-o	9.500.000 COP/mes
Horizonte de análisis	5 años
Duración de construcción	6 meses
Escala modelada	36 sedes · 25.000 personas

Una variación de ±10 % en la tasa de cambio mueve el costo de infraestructura ±150.000 COP/mes. La sensibilidad completa está en la lámina 14.

Costo actual de la plataforma

99-0 · MENSUAL

9,5 M

COP por mes, confirmado por la administración.

99-0 · ANUAL

114 M

COP por año, sin contar incrementos.

99-0 · 5 AÑOS

570 M

COP, asumiendo tarifa congelada — supuesto optimista a favor de 99-o.

POR PERSONA

4.560

COP al año por cada uno de los 25.000 asistentes.

Qué se recibe hoy por esos 114 millones al año

MÓDULO CONTRATADO	ESTADO REAL	OBSERVACIÓN
Ovejas / perfil 360	Operando	Es el núcleo del valor recibido
Grupos familiares y pequeños	Operando	Con autoinscripción
Bitácora de actividades	Operando	La pieza más valiosa a preservar en la migración
Consejería y solicitudes	Operando	
Cursos con precio y cupo	Operando	
Chat interno	No habilitado	No habilitado en esta instancia
Servicio de correo	No habilitado	No habilitado en esta instancia
Personalización	No disponible	Los flujos propios de la organización no son configurables

El componente no económico

Además del costo, hay una consideración de gobierno del dato: **la información pastoral de 25.000 personas —incluidos menores— reside hoy en infraestructura de un tercero**, bajo su modelo de seguridad, su calendario de respaldos y sus decisiones de continuidad del servicio.

Con infraestructura propia, la responsabilidad sobre esos datos pasa a la organización. Ese cambio explica las partidas de seguridad y legales que este modelo incorpora y que hoy no existen: **el ahorro se presenta neto de esos costos nuevos.**

Infraestructura ajustada — línea por línea

Este es el escenario dimensionado para la carga real calculada en el Documento 1 (36 sedes, 25.000 personas, pico de 120 peticiones/segundo). Cubre los 14 pilares de arquitectura **sin recortar seguridad**; lo que se ajusta es holgura y comodidad operativa.

COMPONENTE	DIMENSIONAMIENTO	USD/MES	COP/MES	% DEL TOTAL
PostgreSQL gestionado	2 vCPU · 4 GB · alta disponibilidad · 100 GB	120	486.000	32,3 %
Contenedores de API	2 × (0,5 vCPU · 1 GB) en 2 zonas	36	145.800	9,7 %
Contenedor de trabajadores	1 × (0,25 vCPU · 0,5 GB) — colas y tareas nocturnas	9	36.450	2,4 %
Keycloak (identidad)	2 × (0,5 vCPU · 1 GB) — base compartida	36	145.800	9,7 %
Balanceador de carga	Único punto de entrada + certificados	25	101.250	6,7 %
Salida controlada a internet	Instancia pequeña en vez de pasarela gestionada	4	16.200	1,1 %
Redis	1 nodo micro — caché, colas y límites de tasa	12	48.600	3,2 %
Almacenamiento de objetos	250 GB — documentos y fotos, cifrado y versionado	8	32.400	2,2 %
Red de distribución (CDN)	100 GB de salida mensual	10	40.500	2,7 %
Gestión de llaves	Cifrado por columna de datos N3/N4 + rotación	6	24.300	1,6 %
Gestor de secretos	Credenciales fuera del código, con rotación	8	32.400	2,2 %
Registro y métricas	Retención 30 días, alertas por objetivo de servicio	12	48.600	3,2 %
Cortafuegos de aplicación	Reglas OWASP + anti-bot + límite por IP	27	109.350	7,3 %
Correo transaccional	150.000 envíos/mes	15	60.750	4,0 %
Registro de imágenes	Contenedores versionados y firmados	3	12.150	0,8 %
Respaldos + bóveda inmutable	PITR 35 días + copia en cuenta separada 90 días	18	72.900	4,9 %
Subtotal producción		349	1.413.450	94,1 %
Preproducción	Bajo demanda: se enciende ~40 h/semana para pruebas	22	89.100	5,9 %
TOTAL ESCENARIO A	Producción + preproducción	371	1.502.550	100 %

Resultado frente al objetivo de referencia

El total es de **1.502.550 COP/mes**, dentro del objetivo de referencia de 1.500.000. El margen es estrecho: cualquier componente adicional lo supera, lo que motiva la reserva presupuestal recomendada más adelante.

Diferencias frente al escenario B

Sin réplica de lectura (los reportes pesados irán contra la base principal), instancia de salida en vez de pasarela gestionada (más mantenimiento manual), observabilidad básica, y preproducción que no está siempre encendida. **Ninguna de estas diferencias afecta a seguridad**: las partidas de seguridad son idénticas en los tres escenarios.

Tres escenarios, y cuál se recomienda

CONCEPTO	A · AJUSTADO	B · RECOMENDADO	B CON COMPROMISO	C · CRECIMIENTO (AÑO 3+)
Base de datos	120	236	165	330
Réplica de lectura	—	48	34	68
Cómputo (API + trabajadores + identidad)	81	126	101	210
Red (balanceador + salida + CDN)	39	84	84	115
Caché y colas	12	25	25	45
Almacenamiento y respaldos	26	42	42	75
Seguridad (WAF, KMS, secretos)	41	41	41	48
Observabilidad	12	51	51	65
Correo y registro de imágenes	18	18	18	24
Preproducción	22	90	90	120
TOTAL USD/mes	371	761	651	1.100
TOTAL COP/mes	1.502.550	3.082.050	2.636.550	4.455.000
TOTAL COP/año	18,0 M	37,0 M	31,6 M	53,5 M

RECOMENDACIÓN

Arrancar en A, con gatillos definidos

La carga calculada cabe holgadamente en A. Pasar a B **cuando se cumpla un gatillo medible**, no por precaución: utilización sostenida de la base > 60 %, latencia p95 > 300 ms tres domingos seguidos, o un reporte que degrade la operación.

El compromiso a un año baja 14 %

Reservar capacidad de base de datos y cómputo por 12 meses reduce esas líneas entre 20 % y 30 %. En el escenario B son **445.500 COP/mes** menos. Se recomienda hacerlo *después* de tres meses estables, no antes.

Reserva presupuestal sugerida

Presupuestar **2.000.000 COP/mes** (no 1,5 M) deja 500.000 de colchón para absorber el paso a B, un pico de tráfico o un movimiento de la tasa de cambio, sin requerir una nueva aprobación presupuestal.

Cuánto cuesta la IA que va a escribir el backend

Esta es la partida que suele estimarse mal. Se calcula desde el volumen de código, no desde una intuición.

Método de estimación, en cuatro pasos

- 1. **Volumen de obra:** 11 dominios, ~126 tablas, 9 módulos, migración y pruebas → **≈ 85.000 líneas** de código productivo más pruebas.
- 2. **Costo por línea aceptada:** la relación observada en desarrollo asistido es de **~500 tokens de salida por línea que sobrevive** — incluye intentos descartados, iteración y explicaciones al revisor.
- 3. **Salida total:** $85.000 \times 500 = 42,5$ millones de tokens de salida.
- 4. **Entrada total:** el desarrollo agéntico relee contexto en cada turno; la relación entrada:salida es ~10:1 → **425 millones de tokens de entrada**.

La palanca que reduce esto a la mitad

Caché de contexto. El contexto estable de cada sesión (arquitectura, esquema, convenciones) se cobra a **una décima parte** de la tarifa de entrada cuando se lee desde caché en lugar de reprocesarse.

Supuesto usado: 85 % lecturas de caché, 10 % entrada nueva, 5 % escrituras de caché. Es alcanzable, pero **no es automático**: depende de que el equipo mantenga estable el prefijo de cada sesión. Si no se hace, el costo de IA se duplica — está cuantificado en la lámina siguiente.

MODELO	ENTRADA USD/M	SALIDA USD/M	LECTURA DE CACHÉ	ROL EN EL PROYECTO
Claude Opus 5	5,00	25,00	0,50	Arquitectura, modelo de datos, motor de políticas, depuración difícil, revisión de código
Claude Sonnet 5	3,00	15,00	0,30	Volumen principal: módulos, servicios, rutas, pruebas. Tarifa introductoria menor hasta el 31 ago 2026
Claude Haiku 4.5	1,00	5,00	0,10	Trabajo mecánico: migraciones repetitivas, semillas, formateo, clasificación

Tarifas oficiales por millón de tokens verificadas al 30 de julio de 2026. Las escrituras de caché cuestan 1,25× la tarifa de entrada; las lecturas, 0,1×.

El costo real del motor de IA

ESCENARIO DE EJECUCIÓN	ENTRADA	SALIDA	TOTAL USD	TOTAL COP	VS. MEZCLA
Mezcla recomendada 30 % Opus 5 · 60 % Sonnet 5 · 10 % Haiku 4.5		\$358	\$723	1.081	4.378.050 —
Todo en Opus 5 máxima capacidad, sin optimizar costo		\$526	\$1.063	1.589	6.435.450 +47 %
Mezcla, pero sin caché de contexto el escenario si no se cuida la disciplina		\$1.318	\$723	2.041	8.266.050 +89 %
Todo en Opus 5 y sin caché el peor caso razonable		\$2.125	\$1.063	3.188	12.911.400 +195 %

COSTO DE IA · TOTAL DEL PROYECTO

4,38 M

COP para construir **el backend completo**. No es una cifra mensual: es el total de los 6 meses.

EQUIVALE A

0,4

meses de lo que hoy se paga por 99-o. El motor que construye el reemplazo cuesta menos de medio mes del sistema actual.

HERRAMIENTAS COMPLEMENTARIAS

1,46 M

COP · asignación para herramientas de generación de código complementarias durante 6 meses. **Tarifa por confirmar al contratar.**

TOTAL MOTOR DE IA

5,84 M

COP · modelos de lenguaje y herramientas complementarias, los 6 meses de construcción completos.

Alcance de la estimación

Es una **estimación con método declarado, no una cotización**. Las dos variables que la pueden mover son el volumen real de código (si el alcance crece 30 %, el costo crece 30 %) y la disciplina de caché. **El riesgo está acotado:** el peor caso razonable de la tabla es 12,9 M COP — que sigue siendo el 11 % de lo que cuesta un año de 99-o. Se recomienda presupuestar **9 M COP** para esta partida y reportar el consumo real mensualmente.

Lo que se paga una sola vez

Estas partidas **no existen hoy** porque hoy la responsabilidad sobre los datos es del proveedor. Al traer la infraestructura a casa, la responsabilidad —y su costo— también vienen. Omitirlas sería presentar un ahorro que no es real.

PARTIDA	QUÉ CUBRE	COP	COMPUERTA QUE LA EXIGE
Prueba de intrusión externa	Auditoría de seguridad por un tercero independiente, informe de hallazgos, remediación y reverificación	12.000.000	G5 · sin esto no se sale a producción
Asesoría jurídica de datos	Política de tratamiento, textos de autorización por canal, aviso de privacidad, autorización específica para menores, registro ante la SIC y contrato de encargo	6.000.000	G5 · hallazgo H-02
Capacitación	Materiales, sesiones para pastores y coordinadores, manual de operación, formación de dos personas técnicas de la organización	3.000.000	G6 · cierre del proyecto
Herramientas de desarrollo	Repositorio, tubería de integración continua y gestión del trabajo · 6 meses	1.800.000	G1 · fundación
Dominio y certificados	Dominio propio + certificados · 3 años	600.000	G1
Subtotal		23.400.000	
Contingencia 15 %	Reserva para desviaciones en las partidas anteriores	3.510.000	
TOTAL INVERSIÓN ÚNICA		26.910.000	

Criticidad de la partida de seguridad

Los 12 millones de la prueba de intrusión son la línea de mayor cuantía y la de mayor criticidad. Es la única evidencia externa de que las capas de seguridad del diseño operan como se especificó, y constituye el respaldo documental de la organización ante un eventual incidente con datos sensibles o de menores.

Lo que sí se puede diferir

La capacitación puede escalonarse por olas de despliegue en vez de pagarse completa al inicio. Las herramientas de desarrollo pueden empezar en planes gratuitos y escalar. Eso mueve ~2,5 M del mes 1 a los meses 4–6, sin afectar ninguna compuerta.

Dedicación estimada, en horas

El esfuerzo se expresa **medido en horas**. Su valoración económica se define en la asignación presupuestal del proyecto y se trata fuera de este modelo.

Distribución del esfuerzo por fase

FASE	SEMANAS	CONSTRUCCIÓN (H)	ORGANIZACIÓN (H)	TOTAL (H)
F0 · Diseño y aprobación	2	50	24	74
F1 · Fundación e infraestructura	4	100	16	116
F2 · Núcleo e identidad	6	150	30	180
F3 · Módulos pastorales	7	175	28	203
F4 · Migración de 99-o	6	120	40	160
F5 · Aportes, RocaKids y formación	6	150	24	174
F6 · Seguridad y remediación	4	75	16	91
F7-F8 · Piloto y 36 sedes	6	100	60	160
F9 · Estabilización y entrega	3	50	20	70
TOTAL	30 sem.	970	258	1.228

Las fases se traslapan; las 30 semanas no son la suma de las columnas. El calendario detallado está en el Documento 3.

Composición del esfuerzo

CONCEPTO	HORAS	%
Equipo de construcción	970	79 %
Equipo de la organización	258	21 %
Total	1.228	100 %

La valoración económica de estas horas se define en la asignación presupuestal del proyecto y no forma parte del alcance de este modelo financiero.

Naturaleza de las 258 horas de la organización

Son horas de decisión, no de ejecución: la matriz de permisos (H-01), la validación de la migración (compuerta G4), la definición de reglas pastorales y la aprobación de cada compuerta corresponden a la organización. Su disponibilidad condiciona el avance entre fases y por eso se planifican con antelación.

Costo del año 1 y costo recurrente

Año 1 · construcción (6 meses) + operación (6 meses)

CONCEPTO	COP	NATURALEZA
Infraestructura · meses 1–6 (dev + preprod)	3.606.000	Recurrente parcial
Infraestructura · meses 7–12 (producción)	9.015.300	Recurrente
Motor de IA (Claude + complementarias)	5.840.000	Único
Prueba de intrusión externa	12.000.000	Único
Asesoría jurídica de datos	6.000.000	Único
Capacitación	3.000.000	Único
Herramientas, dominio y certificados	2.400.000	Único / parcial
Contingencia 15 % sobre lo único	3.510.000	Reserva
TOTAL AÑO 1 (sin esfuerzo humano)	45.371.300	
99-o durante el mismo año 1	114.000.000	Costo evitado
AHORRO NETO AÑO 1	68.628.700	60,2 % menos

Supone que 99-o se mantiene activo hasta el corte y se da de baja al final del mes 8. Si el corte se retrasa, el ahorro del año 1 baja ~9,5 M por mes de solapamiento.

Año 2 en adelante · solo operación

CONCEPTO	COP/AÑO	NOTA
Infraestructura (escenario A · 12 meses)	18.030.600	Con reserva a 2,0 M/mes: 24,0 M
Prueba de intrusión anual	12.000.000	Obligatoria, no diferible
IA de mantenimiento y evolución	2.400.000	~25 % del ritmo de construcción
Renovaciones (dominio, herramientas)	1.200.000	
TOTAL RECURRENTE	33.630.600	
99-o equivalente	114.000.000	
AHORRO ANUAL SOSTENIDO	80.369.400	70,5 % menos

No incluye horas de soporte y evolución continua, que dependen del acuerdo de servicio que se firme. El modelo de soporte propuesto está en el Documento 3.

Nota metodológica sobre el cálculo del ahorro

Comparando *únicamente* infraestructura, la diferencia es de **9,5 M menos 1,5 M = 8 M/mes**, equivalente a 96 M al año. Este documento presenta **80,4 M/año** porque descuenta además las partidas que la infraestructura propia incorpora y que hoy no existen: prueba de intrusión anual, IA de mantenimiento y renovaciones. Los 15,6 M de diferencia corresponden al costo de operar la plataforma con los controles de seguridad y cumplimiento especificados en el Documento 1.

Comparativo acumulado a cinco años

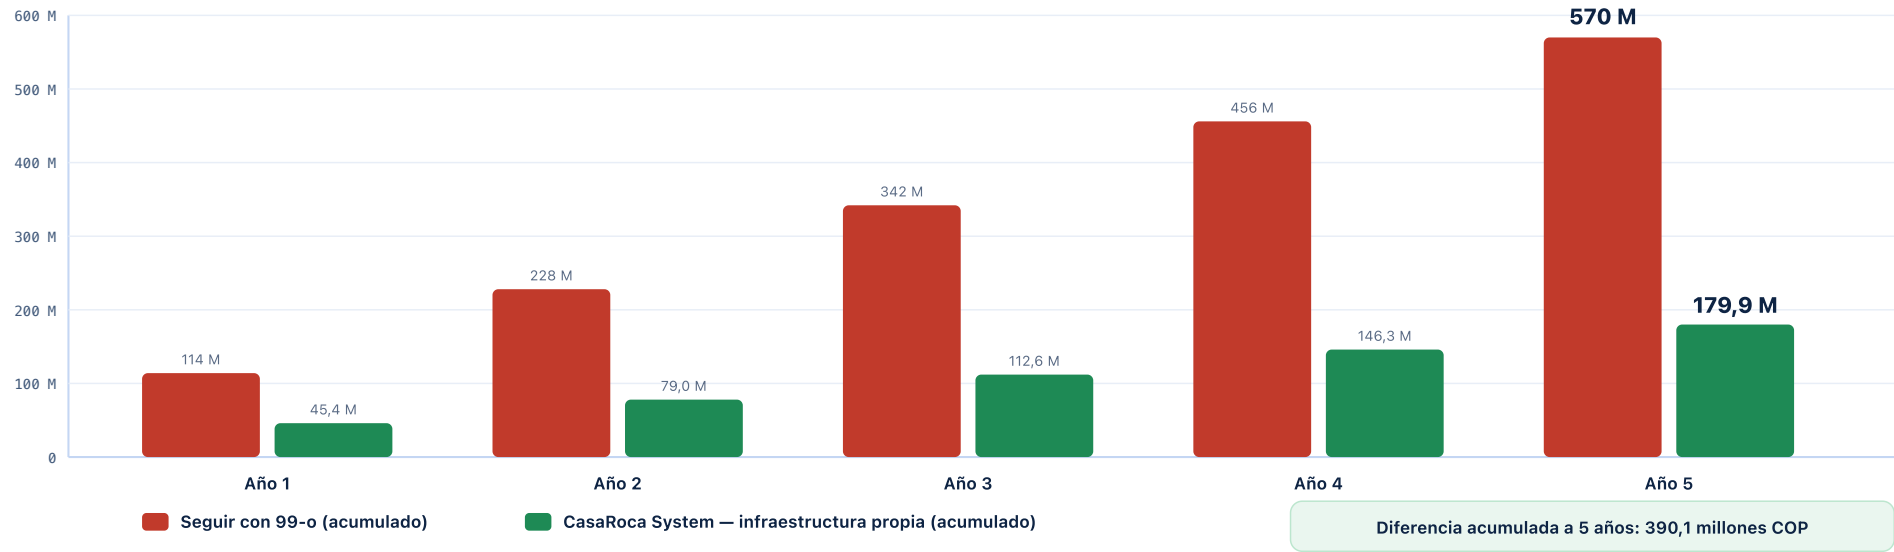


Fig. 1 – Costo total acumulado. No incluye la valoración del esfuerzo humano (ver lámina 9).

AHORRO A 5 AÑOS

390 M

COP de diferencia acumulada.

REDUCCIÓN DE COSTO

68 %

del gasto total en plataforma.

COSTO POR PERSONA/AÑO

1.345


COP en régimen, frente a 4.560 hoy.

Y ADEMÁS

36

sedes con un sistema hecho a su medida, y datos de menores bajo control propio.

Flujo de caja mes a mes del año 1

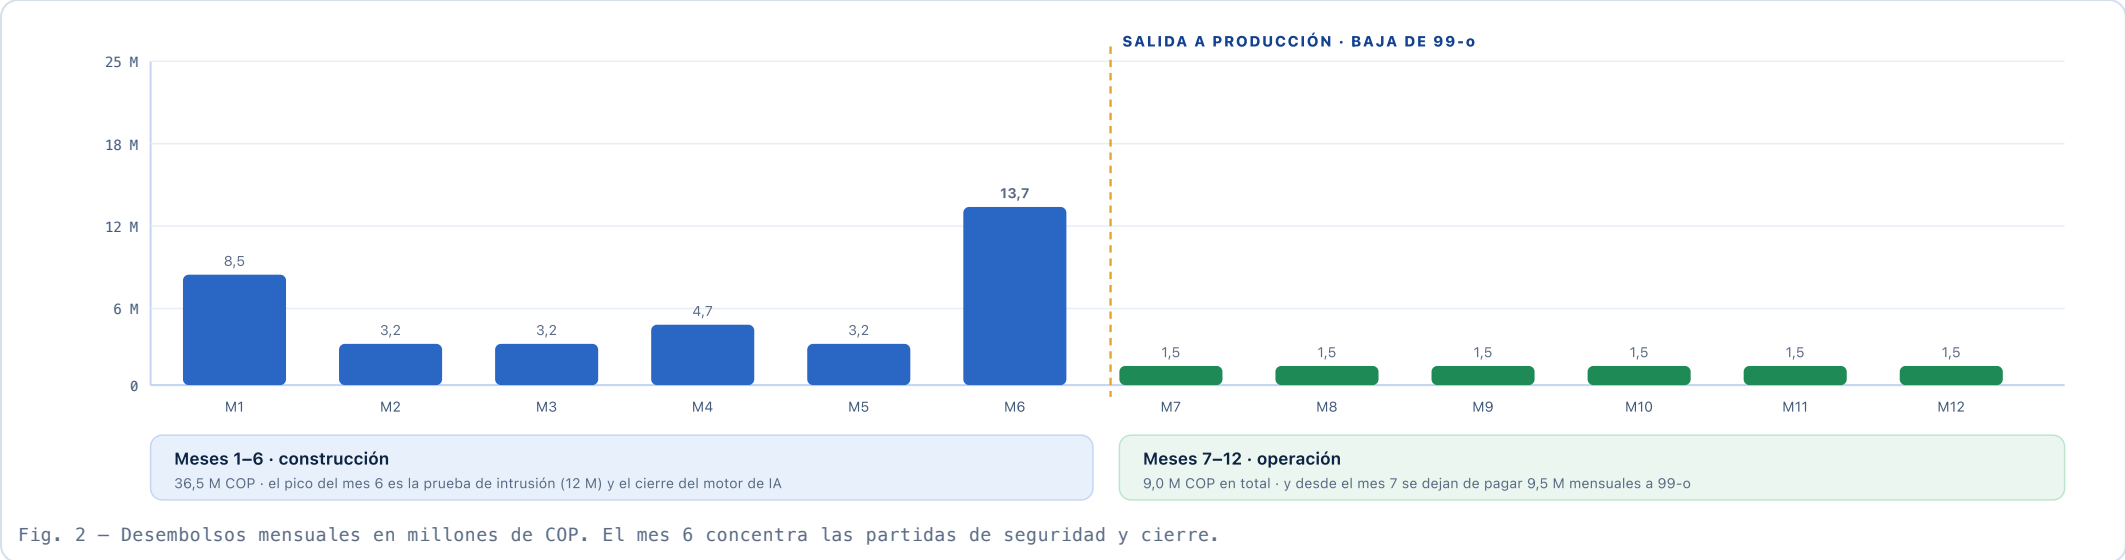

Máximo desembolso mensual

13,7 M COP en el mes 6. Es el único mes que supera lo que hoy se paga a 99-o. Si la tesorería lo necesita, la prueba de intrusión puede facturarse 50 % al inicio y 50 % contra informe, repartiendo el pico entre los meses 5 y 6.

Los meses 1 a 6 son doble gasto

Durante la construcción se paga 99-o y la nueva infraestructura. Ese solapamiento está incluido: el ahorro del año 1 (68,6 M) ya lo descuenta. Es el costo de no apagar el sistema actual hasta estar seguros — y es exactamente lo que hace que el corte sea de bajo riesgo.

Desde el mes 7 el gasto se estabiliza

1,5 M COP al mes, con la única variación de la prueba de intrusión anual. Es un gasto predecible, sin renovación de licencia y sin exposición a un aumento decidido por un tercero.

PUNTO DE EQUILIBRIO

Cuándo se recupera la inversión

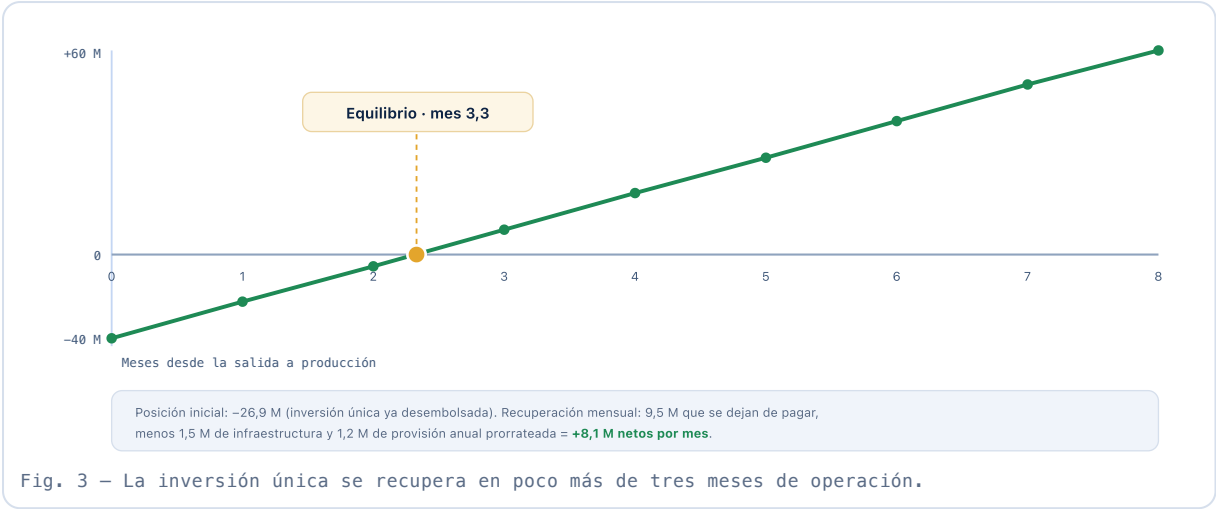


Fig. 3 – La inversión única se recupera en poco más de tres meses de operación.

RECUPERACIÓN

3,3 meses

desde la salida a producción. En el calendario del Documento 3, eso cae aproximadamente en el **mes 9 del proyecto**.

RETORNO A 5 AÑOS

1.350 %

sobre la inversión única de 26,9 M. Cada peso invertido en seguridad, legal y capacitación devuelve 13,5 pesos en cinco años.

Lectura del indicador

El retorno no depende del largo plazo: **la inversión única se recupera antes de cerrar el primer trimestre de operación**, y a partir de ese punto se liberan aproximadamente ocho millones mensuales del gasto actual en plataforma. El cálculo no incorpora supuestos de crecimiento ni proyecciones optimistas.

Qué pasa si las cosas salen distinto

Un modelo financiero que solo muestra el caso favorable no sirve para decidir. Estos son los seis escenarios adversos con impacto real.

ESCENARIO	PROBABILIDAD	IMPACTO EN COSTO	¿SIGUE CONVINIENDO?	MITIGACIÓN
La organización crece a 50.000 personas y 60 sedes	● Media	Infra pasa a escenario C: +2,95 M/mes → +35,4 M/año	● Sí — ahorro cae a 45 M/año	Ninguna: es crecimiento sano y el diseño lo absorbe sin rehacerse
La tasa de cambio sube a 4.500 COP/USD	● Media	Infra +11 %: +2,0 M/año	● Sí — impacto marginal	Reserva presupuestal de 2,0 M/mes ya lo absorbe
El alcance crece 30 % (más módulos de los previstos)	● Alta	IA +1,3 M y esfuerzo +290 h	● Sí	Control de cambios por compuerta; nada entra al alcance sin re-aprobación
La migración de 99-o resulta manual (hallazgo H-04)	● Media	+120 h de esfuerzo y +3 semanas de calendario	● Sí	Verificar la exportación en la semana 1 — es la tarea más barata del proyecto
La prueba de intrusión encuentra hallazgos críticos	● Media	+4 M de remediación y +3 semanas antes de producción	● Sí	La contingencia del 15 % cubre 3,5 M de esos 4 M
99-o sube su tarifa un 15 %	● Media	Costo de <i>no</i> migrar: +17,1 M/año	● Mejora el caso	Es un riesgo del escenario contrario, no de este proyecto

Escenario adverso combinado

Si ocurrieran **a la vez** el crecimiento a 50.000 personas, la tasa a 4.500, el alcance +30 %, la migración manual y hallazgos críticos en la prueba de intrusión, el costo del año 1 subiría de 45,4 M a **≈ 58 M** y el recurrente de 33,6 M a **≈ 71 M/año**.

Incluso así, el ahorro anual sostenido sería de **43 M** frente a 99-o, y el punto de equilibrio se correría a **6 meses**. En el conjunto de escenarios evaluados, el resultado financiero se mantiene favorable.

El escenario de mayor exposición

La interrupción del proyecto a mitad de ejecución. Supondría un gasto de 30–40 M sin sustituir la plataforma actual, que seguiría facturándose. La principal exposición financiera de este proyecto no es el sobrecosto, sino la **discontinuidad**.

Mitigación: las siete compuertas del Documento 1 y el plan por olas del Documento 3 están diseñados para que en cada punto haya algo funcionando y reversible, nunca un todo-o-nada.

Cómo se vigila que esto no se desvíe

Controles automáticos configurados desde el día 1

- **Presupuesto de nube con alerta al 80 %** del monto mensual aprobado, notificando a la Dirección Financiera y a la Dirección de Tecnología.
- **Tope duro de escalado:** la infraestructura no puede crecer por encima de un límite configurado sin una aprobación explícita. Una falla no puede generar una factura sorpresa.
- **Etiquetado por componente:** cada recurso lleva etiqueta de ambiente y dominio, para poder responder «¿cuánto cuesta RocaKids?» y no solo «¿cuánto cuesta la nube?».
- **Consumo de IA reportado semanalmente** contra el presupuesto de 9 M, con la proyección al cierre del proyecto.
- **Apagado automático** de los ambientes de desarrollo fuera de horario y los fines de semana.

Reporte mensual de una página a la Dirección Financiera

Gasto del mes vs. presupuesto	± %
Acumulado del año vs. plan	± %
Consumo de IA acumulado	/ 9 M
Compuerta abierta actualmente	G0...G6
Hallazgos de auditoría abiertos	n.º
Ahorro acumulado vs. 99-o	COP

Regla de gasto

Ningún componente nuevo de infraestructura se aprovisiona sin que aparezca en este modelo con su línea y su costo mensual. **Si no está en la tabla, no se enciende.** Es la disciplina que impide que un proyecto de nube se desborde en silencio.

CONCLUSIÓN

Recomendación financiera

INVERSIÓN ÚNICA 26,9 M COP · seguridad, legal, capacitación y contingencia	COSTO AÑO 1 45,4 M COP · construcción + operación (sin esfuerzo humano)	RECURRENTE AÑO 2+ 33,6 M COP/año · frente a 114 M de hoy	EQUILIBRIO 3,3 meses tras salir a producción
---	--	---	---

Conclusión del análisis

El proyecto presenta un **resultado financiero favorable y una exposición acotada**. Reduce el gasto en plataforma un 68 % a cinco años, recupera la inversión única en poco más de un trimestre, y en el escenario adverso combinado mantiene un ahorro de 43 millones anuales. **Se somete a consideración de la mesa la aprobación del presupuesto**, con las tres condiciones que se detallan a continuación.

CONDICIÓN 1 Presupuestar 2,0 M/mes El diseño opera dentro de 1,5 M, con margen estrecho. Una asignación de 2,0 M absorbe la variación de tasa de cambio y habilita el paso al escenario B cuando se cumplan sus gatillos, sin requerir una nueva aprobación.	CONDICIÓN 2 Mantener la prueba de intrusión anual Los 12 M anuales constituyen la única verificación externa e independiente de los controles de seguridad, y el respaldo documental de la organización en el tratamiento de datos sensibles y de menores.	CONDICIÓN 3 Reservar las 258 horas de la organización Son horas de decisión: definición de permisos, validación de la migración y aprobación de compuertas. Su disponibilidad condiciona directamente el cumplimiento del calendario.
---	---	--
